

湯沢高等学校整備事業 【教室・管理棟】 工事だより

2025年11月発行 No.7



建物を構造的に支える骨組み（躯体）の コンクリート打設を行いました！

ついこの前まで空調服で作業していたのが一転して寒くなり、急いで冬用ジャンパーを準備しました。寒暖差で体調を崩しやすい季節なので気を付けましょう。


現場では柱や梁、壁、床の鉄筋・型枠が組み上がり、10月から躯体のコンクリート打設を進めています。コンクリート打設は一度打ち始めると待たがきかず、なかなか休憩をとることができません。そのため、みんなで交代しながら協力し合って行います。



2025.11.25 ドローン撮影写真



合 生コン車からポンプ車に生コンを移動させ
長いホースで現場まで運びます

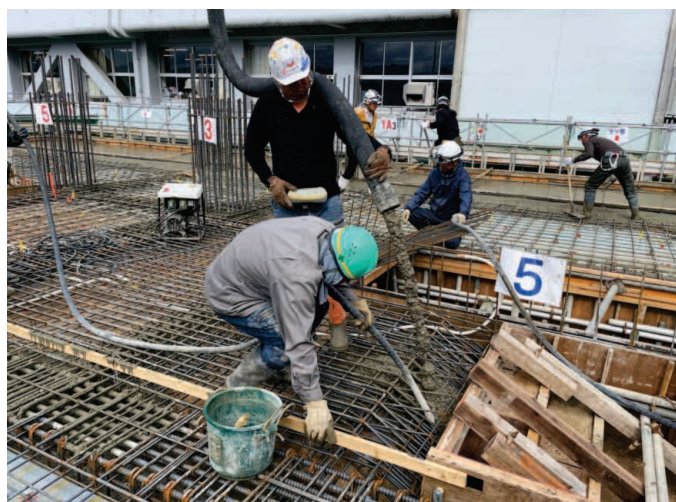

合 階段の打設状況。一段一段確認しながら
隅々まで圧送します




合 梁の打設状況。バイブレーターを使用し
気泡を追いつながら打ちます



合 左官工事の様子。天端高さを確認しながら
生コンの量を調整しています



合 床の打設状況。コンクリートを打った所から
平らに均していきます

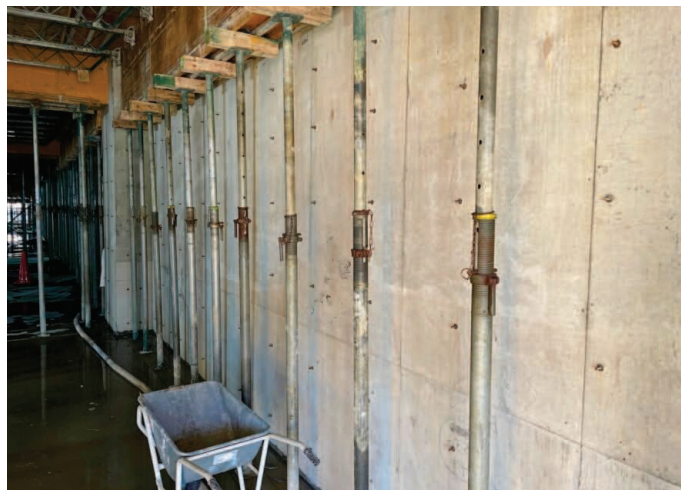

合 壁の型枠を解体すると、よく見かける
コンクリート打ちっ放しの壁が出てきました

今後の工事予定

12 月 ～ R8.1 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鉄筋工事 ・ 型枠工事 ・ コンクリート工事 	鉄筋を組み上げ型枠を設置し、コンクリートを流し込んで 躯体を造ります。(2階の躯体工事後、3階の躯体工事へ)
---------------------	--	---

お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

湯沢高等学校整備事業【教室・管理棟】工事 現場事務所
連絡先：0183-55-8137
